


Main planned TCRs in Atlantic Corridor (ADIF network)



June 2025

Alta Velocidad (1)

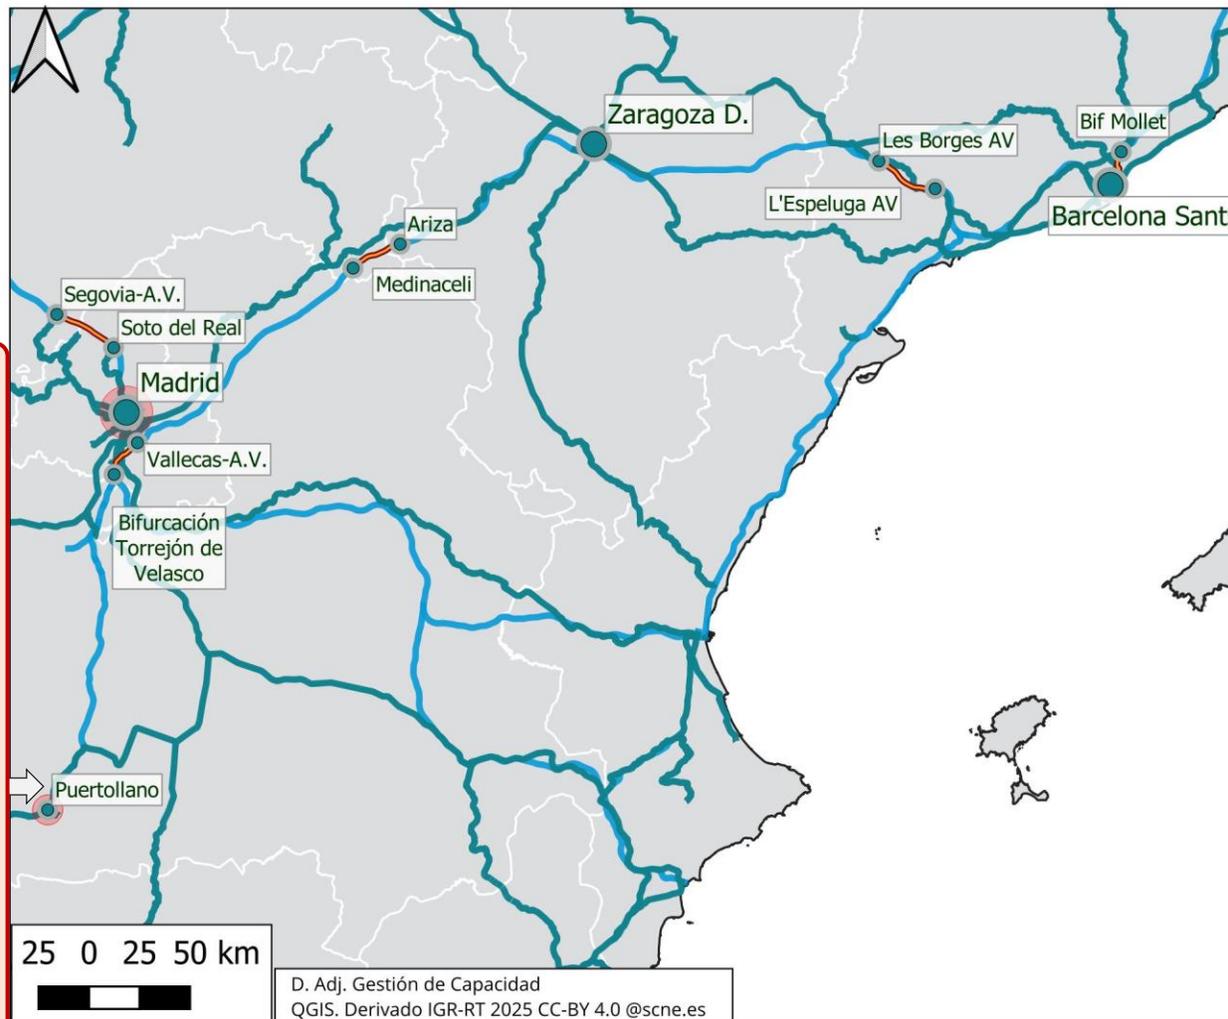

Puertollano (2022-7-024)

Julio 2025 - Diciembre 2025


Remodelación completa de la estación: Nueva vía 6 de apartado, nuevo escape cabecera sur, sustitución de todos los desvíos.

- Afecciones según fases de la obra.
- Afecciones más restrictivas se establecerá PAT:
 - Vía única en los trayectos colaterales cuando se sustituyen desvíos de 22:00 a 10:00 noches de V/S y S/D.
 - LTVs a 80 km/h.
 - La ampliación de tiempos de viaje está considerada dentro del horario de servicio. Posible incremento de 1 minuto min (PAT)
 - 2 Cortes de fin de semana de vía 4 (sólo se dispondrá del andén de vía 3):
 - ❖ 1^{er} corte de viernes noche a lunes por la mañana
 - ❖ 2^o corte de jueves noche a lunes por la mañana.


Centro (1)

Línea 200/908
Hortaleza-Aeropuerto
T4 (2021-1-004)
3^{er} trim 2024 - 4^o trim 2025
Acceso al Aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo
Suarez en ancho estándar.

- 08/02/25-07/07/2025: Corte de **vía 1** entre Chamartín y Hortaleza
- 26/09/2025-13/10/2025 Corte de vías 4, 6 y 22 de Hortaleza (supone vía única entre Hortaleza y Aeropuerto)
- Noviembre 2025: Corte de 1,5 meses vía 1 trayecto Aeropuerto - Hortaleza, generando cortes extraordinarios de fin de semana en L200

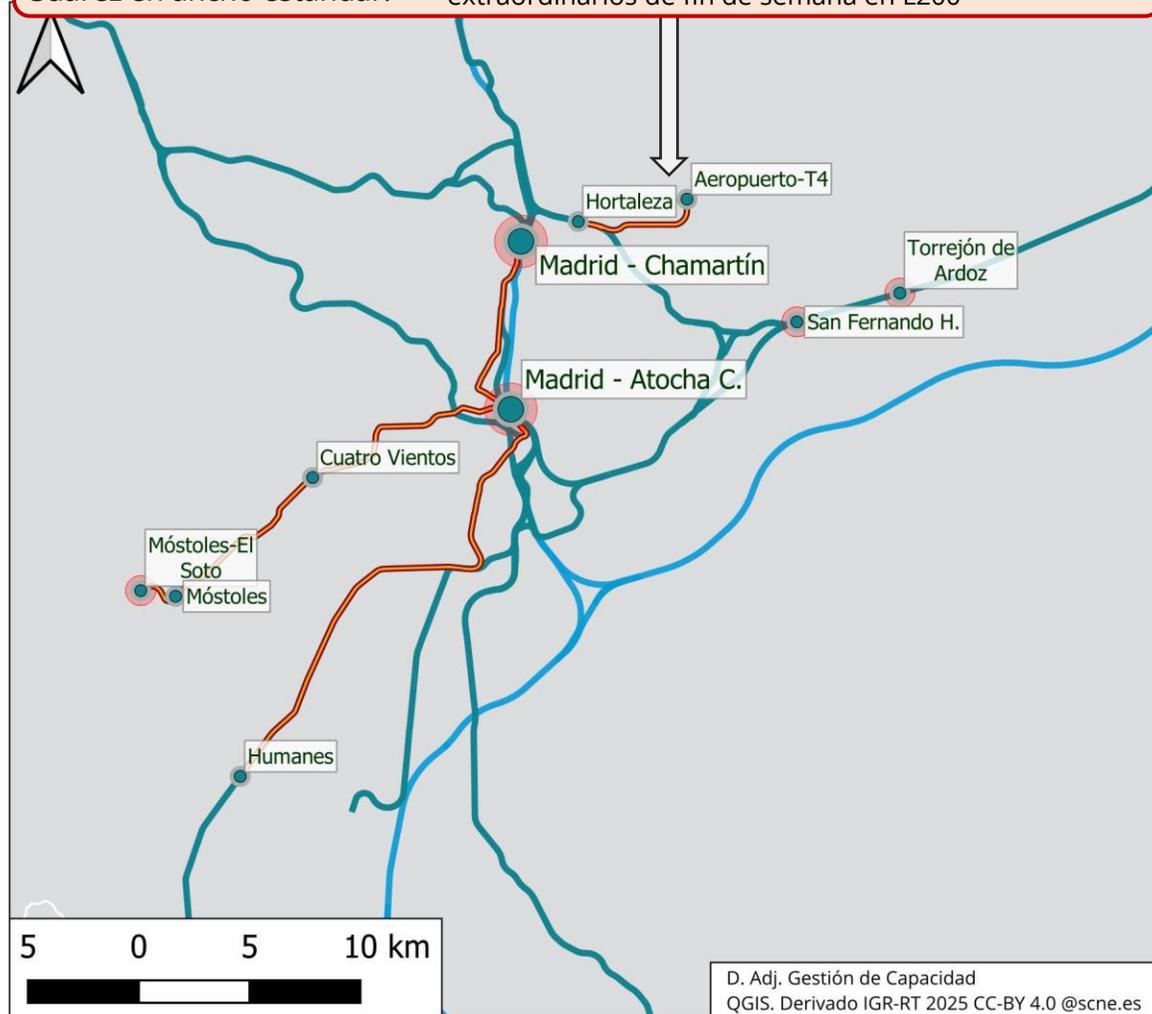

Centro (2)

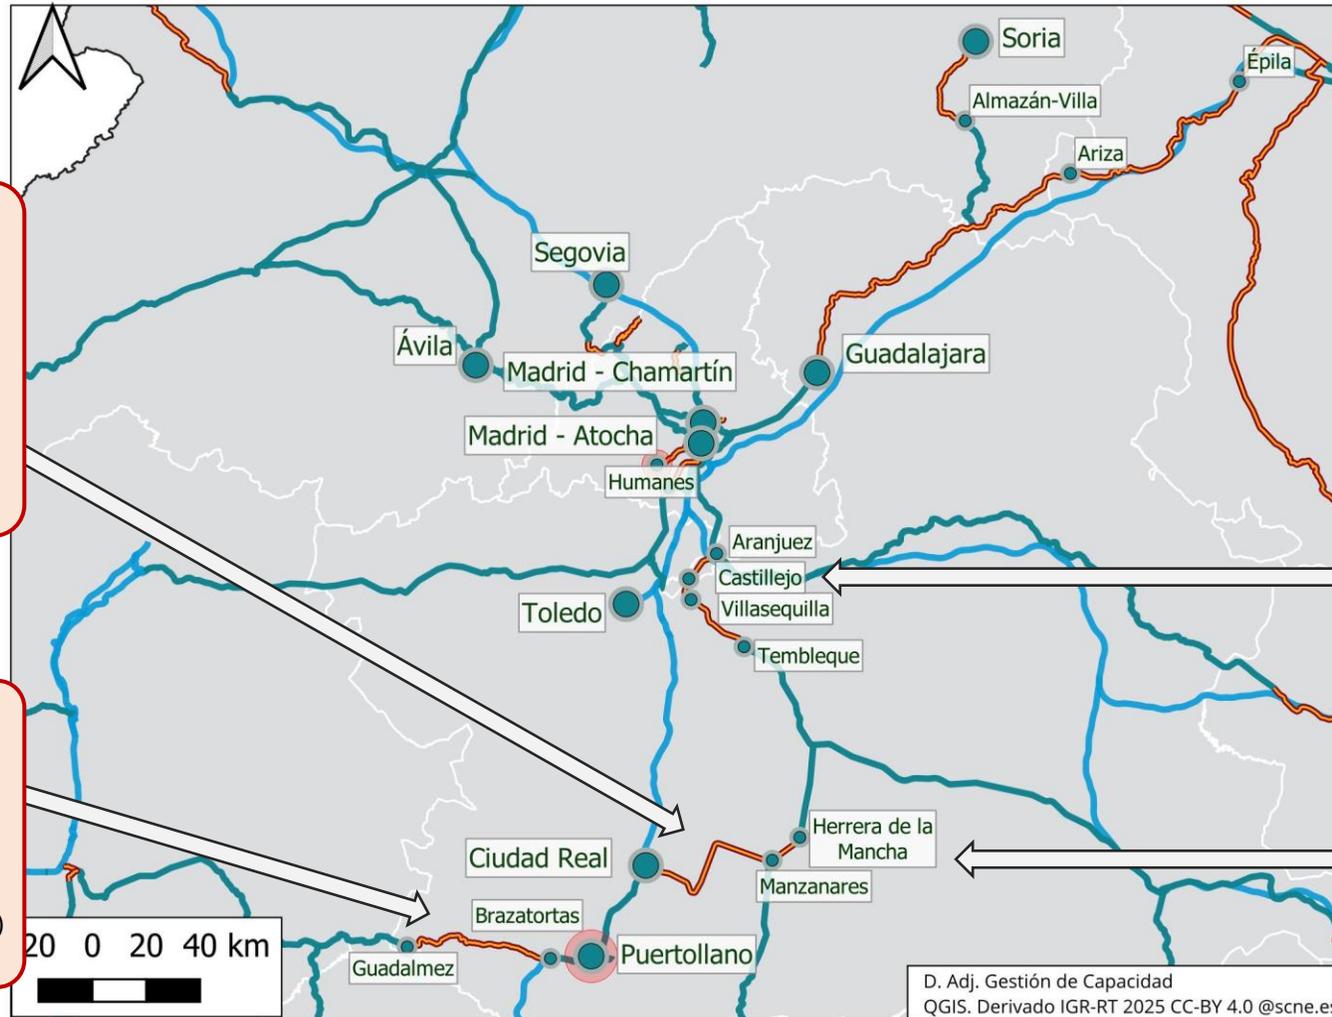

Línea 522 Manzanares - Miguelturra - Bif Poblete (2025-1-009)

- 2027
Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz
- Cortes totales de 11 días y trabajos en BM con intervalo adicional en diferentes puntos del tramo de forma simultánea.

Línea 520 Brazatortas - Guadalmez (2022-1-008)

- Febrero 2023- Octubre 2025
Renovación superestructura e infraestructura de vía.
- 05/02/23 - 05/10/25: Cortes nocturnos en BM con intervalo adicional (durante 8-12h) excepto noches V/S y S/D.

Línea 300 Aranjuez - Castillejo (2022-1-002)

- 2º trim 2027 - 4º trim 2027
Estabilización de terraplén
- Corte de vía alterna durante 7,5 meses
 - 4 meses vía 2
 - 3,5 meses vía 1
 - Durante esos 7,5 meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).
 - LTV vía contigua.

Castillejo-Villasequilla (2022-1-001)

- 2º trim 2027
Corrección de zonas inundables
- Un mes corte de vía 1

Villasequilla - Tembleque (2022-1-005)

- 3º trim 2027
Proyecto de reparación de estructuras
- 7 días/vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).
 - La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces.
- Todas las actuaciones se adaptarán fechas RTC a necesidades. Las tres actuaciones son incompatibles entre sí, pendiente de encaje para salvar estas incompatibilidades.

Línea 400 Herrera - Manzanares (2021-1-007)

- 4º trim 2025 - 1º trim 2028
Instalación de BAB y sustitución de enclavamientos. Renovación de estación y nueva variante.
- Corte de una vía alterna por definir
 - Cortes de 1 y 3 días en fin de semana


Línea 400
Obras vinculadas a la Autopista ferroviaria Zaragoza - Algeciras

Venta de Cárdenas - Los Cansinos
(2023-3-022)
2025-2026: Comenzará tras el corte de la Autopista Ferroviaria Guadalajara - Épila
Adecuación de gálibo de 13 túneles
• Corte estimado 8,5 meses

Espeluy-Villanueva de la Reina (2025-3-004)
3^{er} trim 2025 - 4^o trim 2025
Trabajos en terraplén
• Corte de 4,5 meses coincidente con corte de Autopista Ferroviaria.

Venta de Cárdenas - Vilches
(2025-3-005)
3^{er} trim 2025 - 4^o trim 2025
Reparación de 15 puentes metálicos
• Corte de 11 meses coincidente con corte de Autopista Ferroviaria.

Línea 520
Mérida - Aljucén (2023-3-011)
Se pospone, fecha en estudio. Coordinado con autopista ferroviaria (id. 2023-3-022)
Proyecto constructivo para conexión en Mérida, plataforma y vía

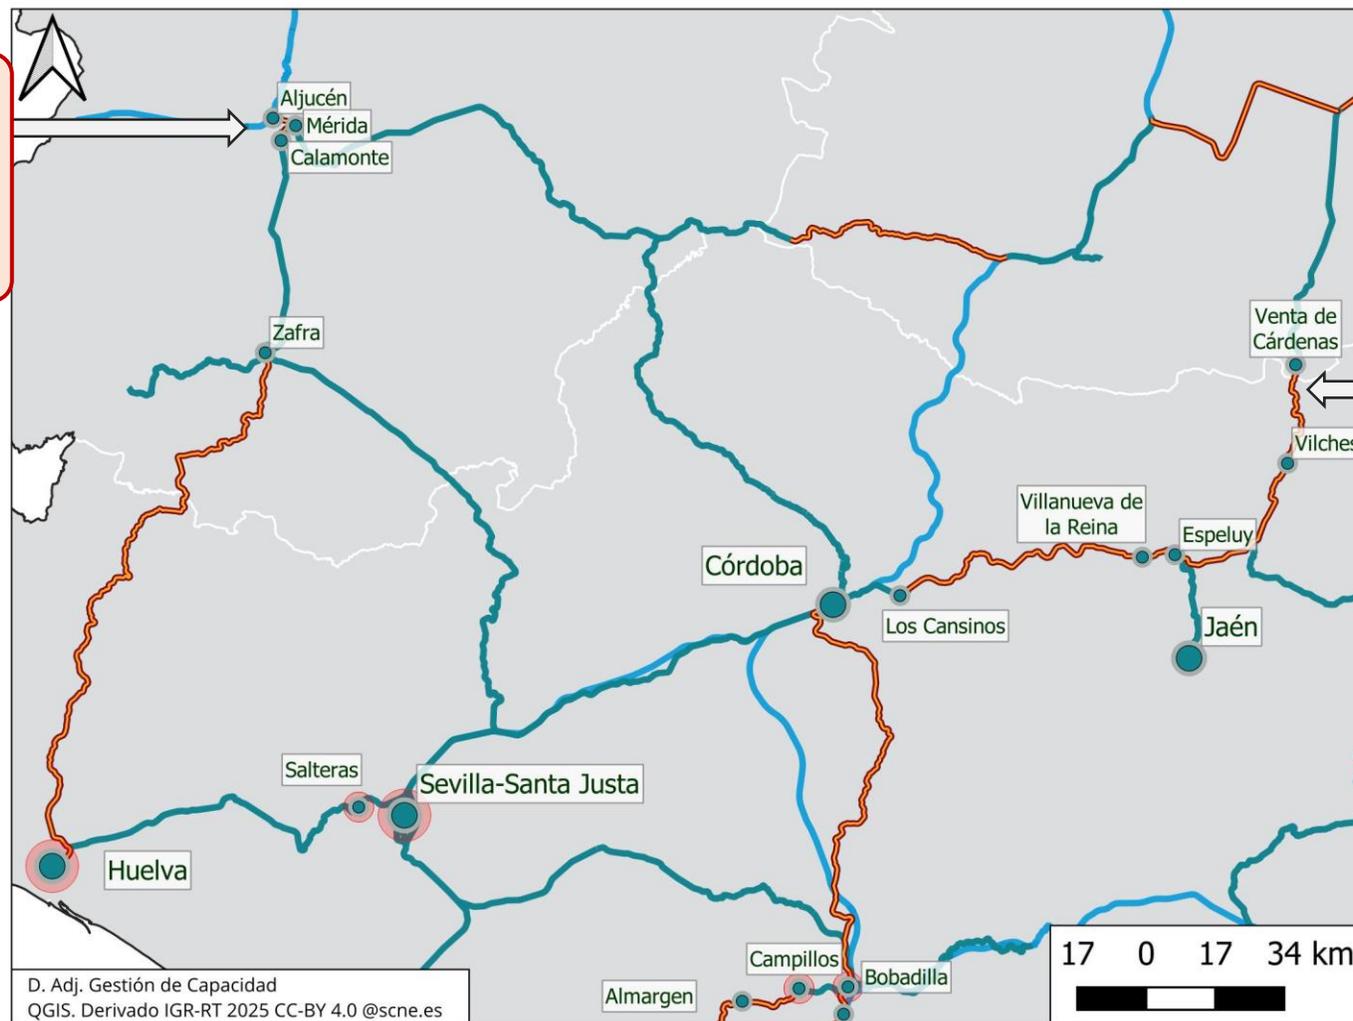

Sur (2)

Línea 420

Ronda - Campillos (2023-3-005)

2º trim 2025- 4º trim 2025

Renovación de vías y actuaciones puntuales y adaptación gálipos PS

- Abril 2025 - Agosto 2025: BM de 5 horas
- 14/07/2025 - 29/07/2025: corte total
- Noviembre 2025: corte de 15 días, fechas en estudio

San Pablo-Almoraima (2022-3-001)

2º trim 2025- 1º trim 2026

Actuación integral en Jimena de la Frontera

y reposición de pasos superiores.

- Mayo 2025 - Abril 2026: vía única
- Noviembre 2025: Corte total de 20 días, fechas en estudio.
- Octubre 2025: 2 días con BM de 8 horas
- Febrero 2026: 5 días con BM de 8 horas

Ronda - Algeciras (2023-3-010)

(Ligado a actuaciones ladera Almargen)

1º trim 2026 - 2º trim 2026

Ampliación de gálipos

- Corte total 3 meses (por determinar)

Almargen (2023-3-013)

(Ligado a actuaciones de autopista ferroviaria Bobadilla- Algeciras)

1º trim 2026 - 4º trim 2026

Estabilización de ladera de Almargen


- Corte total de 10 meses

Campillos-Almargen/Cañete la Real (2025-3-001)

2º trim 2026

Actuaciones en infraestructura y adaptación de gálipo

- Corte total de 20 días.
- Previsto solicitar corte nocturno de vías de la terminal

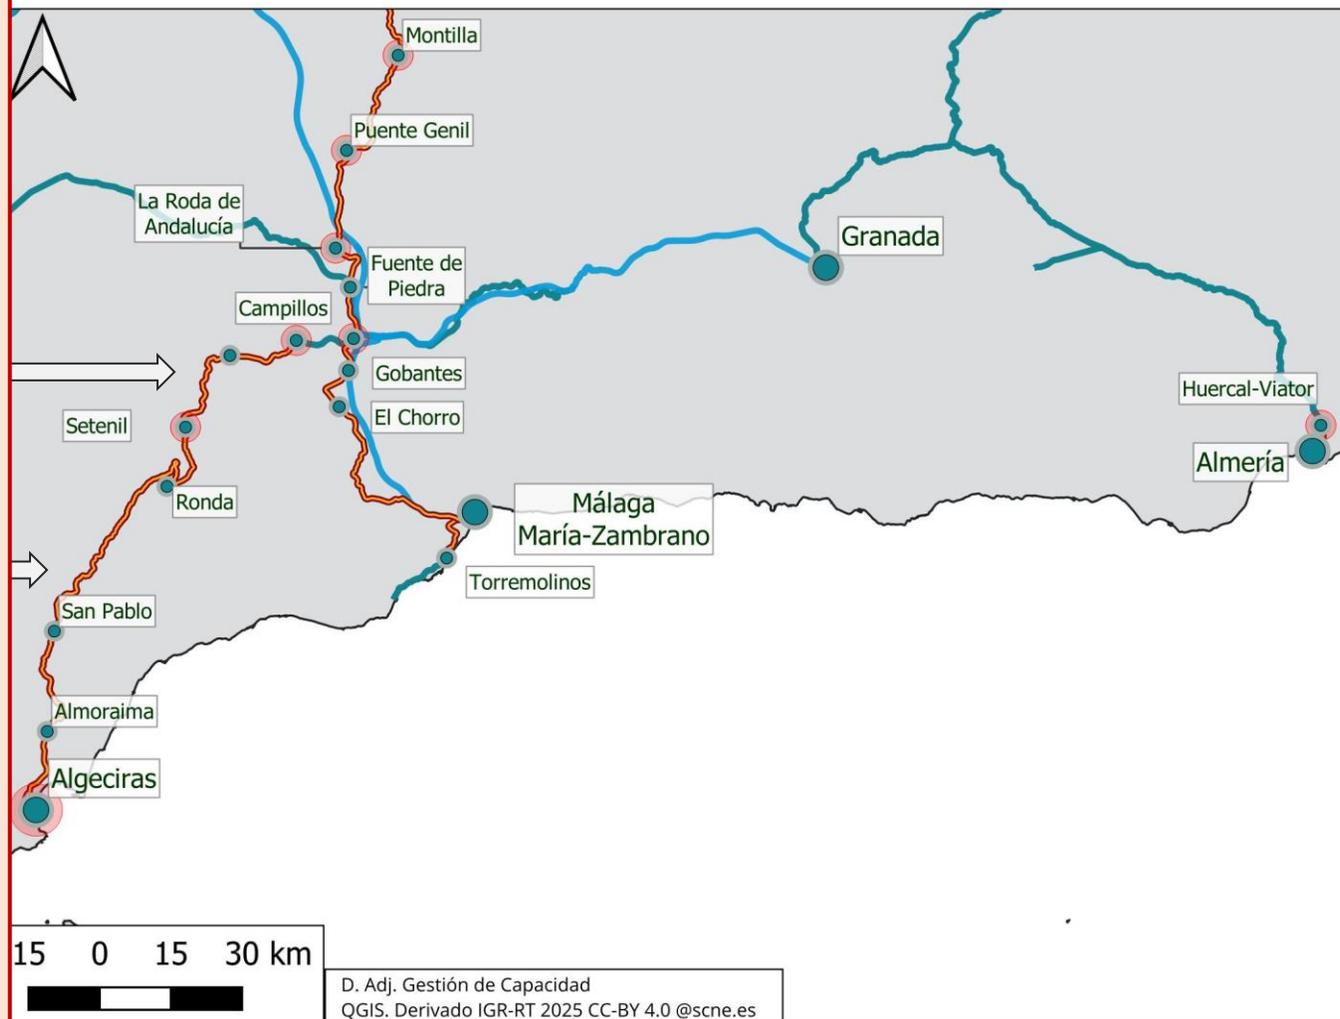

Noreste (1)


Línea 700


Luceni - Cortes de Navarra (2022-5-006)

2º trim 2026 - 4º trim 2026

Terraplén PPKK 49+150 - 50+231

- Corte de vía alterna, 4 meses cada una (LTV en vía contigua) y corte simultáneo de 3h en ambas vías cada día
- No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón

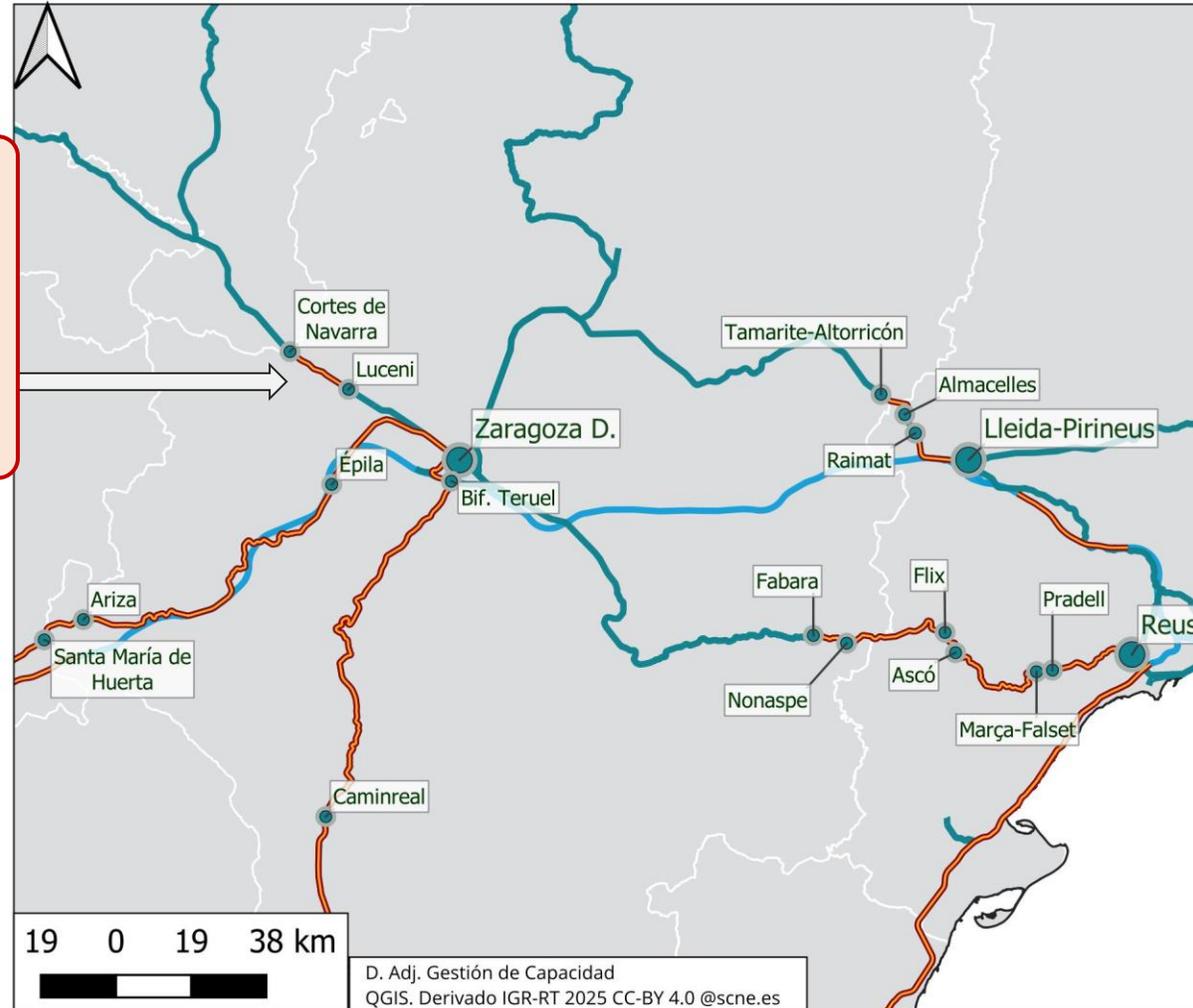

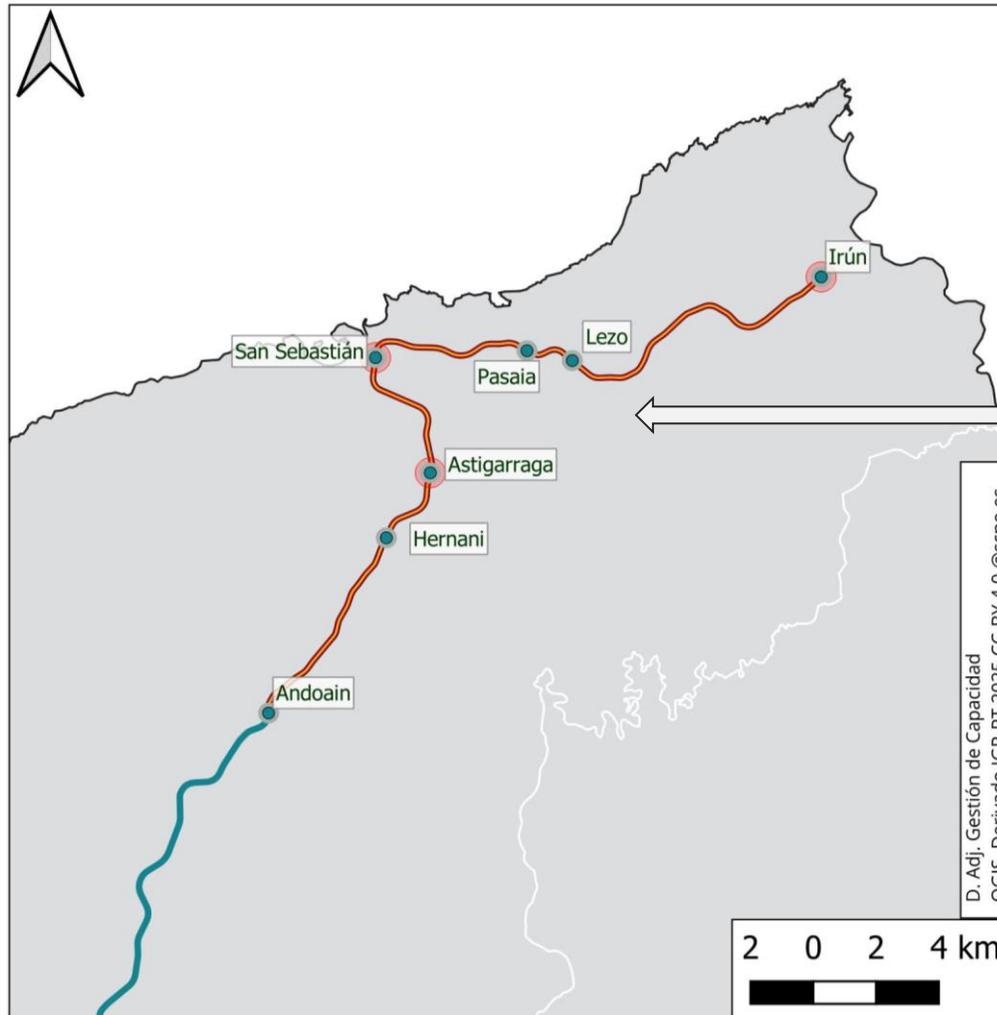

Línea 100

Astigarraga-Irún (2019-6-001)

Implantación ancho mixto y adaptación de instalaciones seguridad y comunicaciones. Trabajos vía en Hernani, prolongación de vía 3 estación Lezo – Rentería, sustitución PI Misericordia, demolición y montaje pasarela Teilería, trabajos en túneles Loiola, Capuchinos y Gaintzurizketa:

Hernani - San Sebastián:

- 29/04/2024 - Agosto 2026: vía única por vía II. **PAT**

- Andoain – Irún

- 25/07/2025 - 04/08/2025

- ❖ Corte total Andoain (Exc.) – Irún (Exc).
- ❖ Corte de tensión Irún (no afecta UIC ni trayecto Irún – Hendaya)

- Hernani – Irún

- 04/08/2025 - 08/09/2025

- ❖ Corte total Hernani (Exc.) – Irún (Exc).
- ❖ Corte de tensión Irún (no afecta UIC ni trayecto Irún – Hendaya)

- Pasaia – Irún

- 08/09/2025 - 22/09/2025

- ❖ Corte total Pasaia (Desde pk 628/100) – Irún (Exc.)
- ❖ Corte de tensión Irún (no afecta UIC ni trayecto Irún – Hendaya)
- ❖ Pasaia:
 - Vías 1 Y 2 útiles hasta pk 628/100.
 - Operativos y con tensión 200m desde R6 hasta topera TPM2.

Línea 724 Bilbao Mercancías - Santurtzi

(2025-6-016)
Agosto 2026
Reparación Túnel del Puerto Bilbao

- Corte de 10 días (en agosto).



Línea 700 Abando Ind.Prieto. - Ollargan

(2022-6-036)
Junio 2026 - Diciembre 2026
Impermeabilización de viaducto.

- Corte de una vía alterna de 3+3 semanas (sin previsión de fechas).
- El corte de vía 1 supone no acceder a talleres de Ollargan si se solapa con la obra del terraplén (previsto fin 3º trim 2026). Si no hay solape de ambas obras, el plazo de la obra se ampliaría a 9 semanas.

Línea 100 Quintanapalla - Santa Olalla

(2022-6-040)
2º trim 2027
Actuaciones en el túnel de la Brújula.

- Corte total 1,5 meses



Línea 700 Bidebieta (2025-6-015)

Junio 2025 - Diciembre 2026
Cubrimiento norte, nuevo Edificio Viajeros y remodelación playa de vías/andenes

- Junio 2025: Corte de 52 horas. (Realizado)
- Junio 2025-Marzo 2026: Corte vía 2
- Marzo 2026: Corte de 52 horas.
- Marzo 2026-Diciembre 2026: Corte vía 1
- Diciembre 2026: Corte de 52 horas.
